


関連事業図

NO SCALE

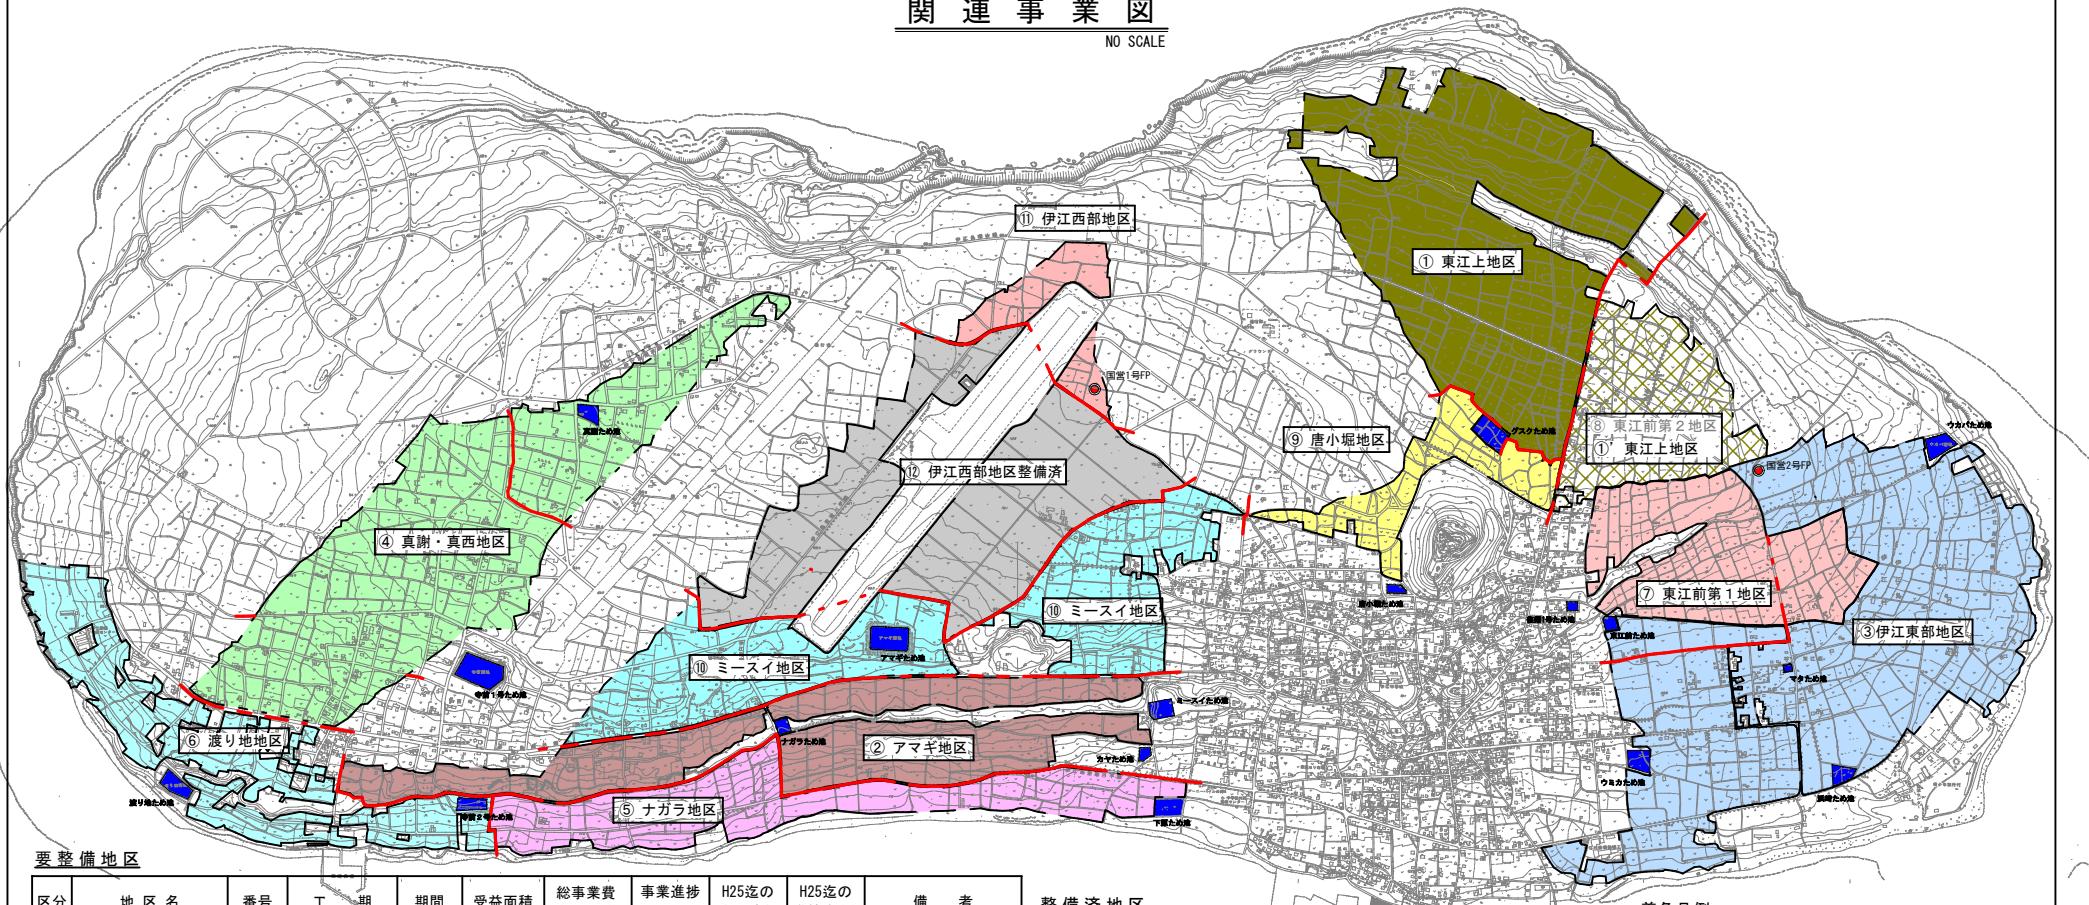

要整備地区

区分	地区名	番号	工期	期間	受益面積	総事業費 (百万円)	事業進捗 区分	H25迄の 支出済額	H25迄の 進捗率(%)	備考
県 営	東江上地区	①	H18～H27	10年	127.1ha	1,491	継続	1,176	78.8	
	アマギ地区	②	H20～H23	4年	52.8ha	682	完(継)	682	100.0	
	伊江東部地区	③	H24～H30	7年	123.0ha	1,142	継続	17	1.5	
	真謝・真西地区	④	H28～H33	7年	86.5ha	1,338	未着手	0	0.0	
	4地区				389.4ha	4,653				
団 体 営	ナガラ地区	⑤	H17～H21	5年	39.0ha	310	完了	310	100.0	
	渡り地地区	⑥	H18～H22	5年	42.1ha	635	完了	635	100.0	
	東江前第1地区	⑦	H22～H26	5年	42.8ha	446	継続	346	77.6	
	東江前第2地区	⑧	H24～H28	5年	20.0ha	361	未着手	0	0.0	H23計画変更にて 東江上地区へ編入
	唐小堀地区	⑨	H29～H33	5年	18.5ha	302	未着手	0	0.0	
	ミースイ地区	⑩	H28～H32	5年	54.2ha	694	未着手	0	0.0	
	伊江西部地区	⑪	H33～H37	5年	14.4ha	174	未着手	0	0.0	
	7地区				289ha	2,561				
	伊江西部地区	⑫	H2～H8	7年	78.0ha	—	整備済			
	計				678ha	7,214				

整備済地区

区分	地区名	工期
県 営	伊江西部	S50～S52
	寺前	H7～H14
団 体 営	東江前	S56～S59
	西江前	S60～S61
	川平	S61～H5
	伊江西部	H2～H8
	ナガラ	H2～H7
	浜崎	H9～H15

着色凡例

地区名	色	地区名	備考
整備済み	■	⑫ 伊江西部地区	団体営
⑤ ナガラ地区	■	② アマギ地区	県営
① 東江上地区	■	⑥ 渡り地地区	団体営
⑦ 東江前第1地区	■	③ 伊江東部地区	県営
⑧ 東江前第2地区	■	①' 東江上地区	県営
⑨ 唐小堀地区	■	④ 真謝・真西地区	県営
⑩ ミースイ地区	■	⑨ 唐小堀地区	団体営
⑪ 伊江西部地区	■	⑩ ミースイ地区	団体営
		⑪ 伊江西部地区	団体営
